



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

SEMANA 1 | 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026


PROYECTO	Adecuación integral de dos viviendas independientes - Proyecto Los Corales
UBICACIÓN	Sector Bahía, Cartagena de Indias
CONTRATANTE	INVERSIONES DALDOAL S.A.S.
CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIÓN CIVIL WORK & INVESTMENT COMPANY S.A.S.
CONTRATO / CÓDIGO	CW029-26
FECHA DE EMISIÓN	13 de septiembre de 2026

Objeto del informe: documentar el avance físico, logístico y fotográfico de la primera semana, compararlo con la Curva S y dejar definidos los frentes prioritarios de la Semana 2.

1. Resumen ejecutivo

Durante la Semana 1 se concentró la ejecución en la liberación de frentes, demolición selectiva, retiro de acabados, manejo inicial de RCD, desconexión eléctrica e inicio de redes hidráulicas y mampostería. Al cierre se reporta: retiro de enchape de piso P1 al 100%; demolición de muros P1 al 100%; demoliciones generales P1 al 90%; desmonte de clósets y puertas P1 al 100%; baño P1 al 30%; retiro de piso P2 al 10%; desconexión eléctrica al 100%; nuevas acometidas hidráulicas al 10%; y mampostería nueva P1 al 10%. Se confirma además un primer retiro de 4 m³ de RCD y el ingreso de ladrillo y cemento para continuar los levantes.

8%	12%	4%	50%
AVANCE VERIFICADO AL 10-SEP	META OPERATIVA DE CIERRE	CURVA S BASE SEMANA 1	HITO PRIMER CORTE SEMANA 5

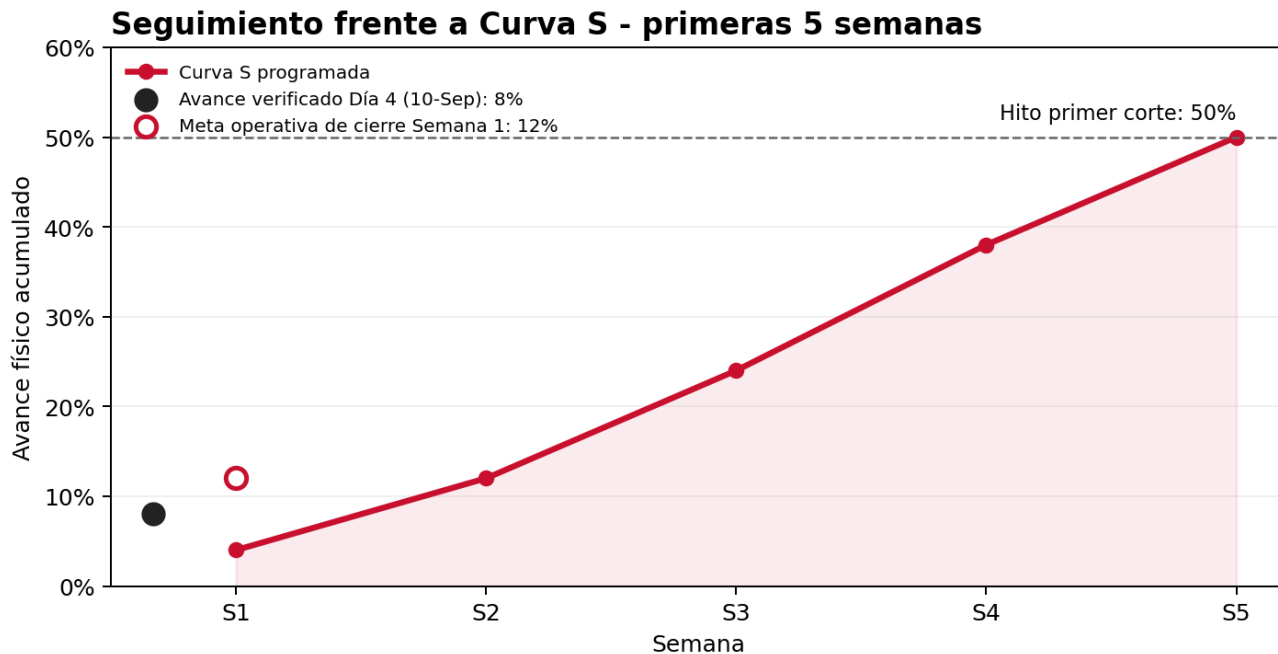

Lectura de control: la Curva S contractual ubica 4% al cierre de Semana 1 y 12% en Semana 2. El informe diario del Día 4 dejó verificado 8% acumulado y manejó una meta operativa acelerada de 12% al 12-Sep. El cierre semanal ya cuenta con porcentajes por actividad, pero estos no deben promediarse entre sí: para obtener un nuevo avance global contractual se requiere ponderarlos con las cantidades/valores de cada partida. Por ello se conserva 8% como último avance global formalmente verificado y se reporta el cierre por frentes de manera cuantificada.

2. Comparación contra el plan de primera fase

Frente	Plan operativo	Estado Semana 1	Semáforo	Lectura
Demoliciones P1/P2	Días 2-4	P1: muros 100% / generales 90% · P2 piso 10%	EN CURSO	Primer piso prácticamente liberado; queda demolición de escalera y muros P2.
RCD y limpieza	Días 5-6	Primer retiro: 4 m ³	EN CURSO	Volumen confirmado para el primer retiro; continuar consolidando soportes.
Escalera / preparaciones	Días 6-8	Pendiente demolición de escalera P2	ATENCIÓN	Debe priorizarse al inicio de Semana 2 para no afectar secuencia.
Fachada P2	Días 7-10	Sin cierre reportado	ATENCIÓN	Actividad crítica de ruta; programar validación y protección.
Mampostería	Días 9-12	Mampostería P1: 10%	INICIADA	Ladrillo y cemento en obra; levantes iniciales ejecutados.
Redes	Días 11-14	Acometidas hidráulicas: 10%	INICIADA	Frente de red hidráulica iniciado; documentar y probar antes de tapar.

3. Actividades ejecutadas - Semana 1

3.1 Retiro de enchape de piso - Piso 1 / 100%	Se completó al 100% el retiro del acabado de piso del primer nivel, dejando la superficie liberada para replanteo, regatas, redes y posteriores actividades de obra gris.
3.2 Demolición de muros - Piso 1 / 100% / CONTROL TÉCNICO	La demolición de los muros previstos del primer piso se reporta al 100% según el replanteo de obra. El cierre semanal los reporta como muros estructurales; por control técnico, debe conservarse la validación estructural/documental correspondiente antes de continuar con intervenciones relacionadas.
3.3 Demoliciones generales - Piso 1 / 90%	Las demoliciones internas generales del primer piso alcanzan aproximadamente 90%, incluyendo retiro de elementos livianos y liberación de frentes para la nueva distribución.
3.4 Desmonte de clósets y puertas - Piso 1 / 100%	El desmonte de clósets y puertas existentes del primer nivel se completó al 100%, despejando las zonas intervenidas y los vanos correspondientes.
3.5 Baño - Piso 1 / 30%	La intervención del baño del primer nivel alcanza aproximadamente 30%, incluyendo retiro parcial de acabados y exposición de zonas para redes.
3.6 Retiro de pisos - Piso 2 / 10%	El retiro de revestimientos de piso en el segundo nivel alcanza aproximadamente 10%. Se mantiene pendiente la mayor parte del frente.
3.7 Desconexión eléctrica / 100%	La desconexión eléctrica de las áreas intervenidas se completó al 100%. Las aperturas, regatas y nuevas canalizaciones asociadas continúan como actividades posteriores de instalación.
3.8 Retiro de material sobrante / RCD / 4 m ³ - PRIMER	Se confirma un primer retiro total de 4 m ³ de material

RETIRO	sobranter/RCD. Mantener soporte de transporte y disposición para la consolidación del corte semanal.
3.9 Nuevas acometidas hidráulicas / 10%	La instalación de nuevas acometidas hidráulicas alcanza aproximadamente 10%, con apertura y preparación inicial de rutas para la vivienda.
3.10 Mampostería nueva - Piso 1 / 10%	La mampostería nueva del primer piso alcanza aproximadamente 10%. Se cuenta con ladrillo y cemento en obra para continuar los levantes y control de vanos durante la Semana 2.

4. Registro fotográfico - demolición y liberación de frentes

Las fotografías fueron tomadas de la carpeta de seguimiento del proyecto en Google Drive. Los registros del 13-Sep se utilizan como evidencia de cierre/inspección del estado resultante de la Semana 1.



Demolición de muro y liberación de vano en primer piso.



Zona húmeda P1: retiro de enchape y exposición de redes.




Superficie de primer piso con acabado retirado y frente liberado.



Demolición de piso y acopio temporal de material antes de evacuación.

5. Registro fotográfico - redes, logística y materiales

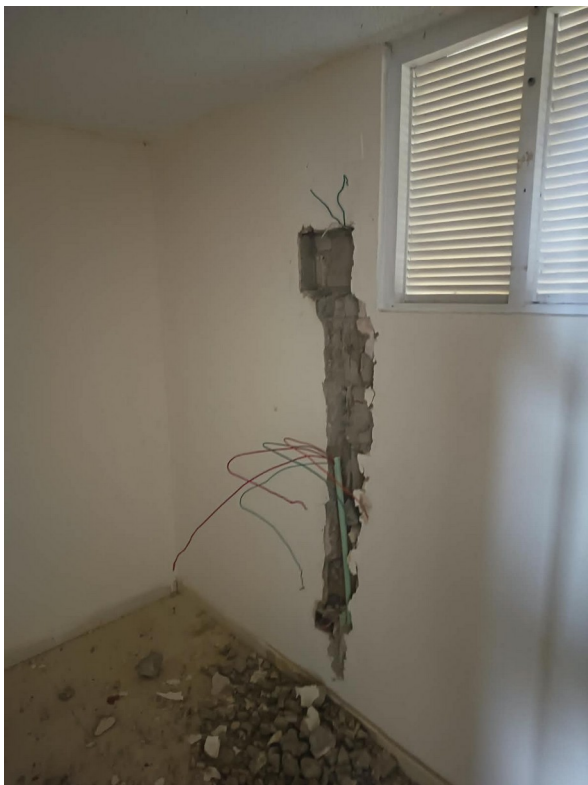

Apertura de regata y conductores expuestos tras desconexión/intervención eléctrica.



Ingreso de cemento para el arranque de obra gris y mampostería.



Salida de material y operación logística en el frente exterior.



Apoyo de transporte y retiro de material sobrante/RCD.

6. Pendientes y plan de acción - Semana 2

Pendientes principales al cierre: demolición de la escalera del segundo piso, demolición de muros del segundo nivel, continuidad del retiro de piso P2 desde el 10% ejecutado, consolidación del retiro de RCD, continuación de la mampostería P1 desde el 10% ejecutado y avance de las nuevas acometidas hidráulicas desde el 10% ejecutado.

Prioridad	Actividad	Resultado esperado	Control requerido
1 - CRÍTICA	Completar demolición de escalera y muros P2	Frentes superiores liberados	Validación técnica, fotos antes/durante/después y medición.
2 - CRÍTICA	Preparación/retranqueo fachada P2	Frente listo para nueva fachada y balcón	Apuntalamiento/protección y revisión previa.
3	Continuar levantes P1 desde 10%	Mampostería nueva con avance acumulado y medición	Control de ejes, vanos, plomo y niveles.
4	Continuar acometidas hidráulicas desde 10%	Rutas y puntos principales instalados y probados	Fotos antes de tapar y prueba de presión.
5	Continuar retiro de pisos P2 desde 10%	Superficies liberadas y m ² medidos	Medición m ² y separación de RCD.
6	Consolidar RCD a partir del primer retiro de 4 m ³	Frentes limpios y soporte acumulado de disposición	m ³ /viajes y comprobantes de retiro.

7. Riesgos y controles de seguimiento

- Intervención de muros reportados como estructurales:** Mantener respaldo de revisión/validación estructural y secuencia de demolición. No continuar intervenciones críticas sin soporte técnico.
- Escalera y fachada P2 en ruta crítica:** Programar al inicio de Semana 2 para evitar desplazamiento del hito del 50% en Semana 5.
- Redes embebidas:** Fotografiar, medir y probar antes de pañetar o cerrar regatas.
- RCD:** Consolidar volumen y soportes de disposición para evitar diferencias en el corte.
- Mampostería:** Validar replanteo y vanos con el plano aprobado antes del levante.

8. Conclusión semanal

La Semana 1 cerró con una liberación material importante de los frentes del primer piso y con inicio efectivo de actividades en el segundo nivel. El avance contractual verificado al Día 4 fue 8%, superior al 4% previsto por la Curva S contractual para la Semana 1. Al cierre semanal ya se cuenta con porcentajes de ejecución por frente: enchape P1 100%, muros P1 100%, demoliciones generales P1 90%, clósets y puertas P1 100%, baño P1 30%, piso P2 10%, desconexión eléctrica 100%, acometidas hidráulicas 10% y mampostería P1 10%. Estos porcentajes describen el estado físico de cada actividad; para convertirlos en un nuevo porcentaje global contractual se requiere aplicar la ponderación de cantidades/valor de cada partida en el acta de medición.

Condición de la programación: el proyecto mantiene capacidad de alcanzar el hito del 50% en la Semana 5, siempre que en la Semana 2 se prioricen la demolición de escalera y muros P2, la preparación de fachada, la continuación de piso P2, y la aceleración de mampostería y redes ya iniciadas al 10%.

Estado general	AVANCE FAVORABLE / FRENTES CUANTIFICADOS
Último avance físico verificado	8,00% acumulado al 10-Sep-2026 (último global formalmente verificado)
Meta operativa de referencia	12,00% referencia operativa de cierre; requiere ponderación contractual para confirmar global
Próximo hito contractual	50,00% acumulado - Semana 5 / primer corte
Cierre por actividades	P1: enchape 100%, muros 100%, demoliciones 90%, clósets/puertas 100%, baño 30%, mampostería 10% · P2: piso 10% · Redes: desconexión 100%, hidráulica 10% · RCD: 4 m ³ primer retiro

GRUPO DE INVERSIÓN CIVIL WORK
Contratista

INVERSIONES DALDOAL S.A.S.
Contratante

Fuentes de control: Cronograma de Obra, Curva S y Plan de Inversión Operativa del Proyecto Los Corales; Informe Técnico de Avance Diario CW029-26 del 11-Sep-2026; registro fotográfico de la carpeta de obra en Google Drive; información de cierre semanal suministrada por el equipo del proyecto.
